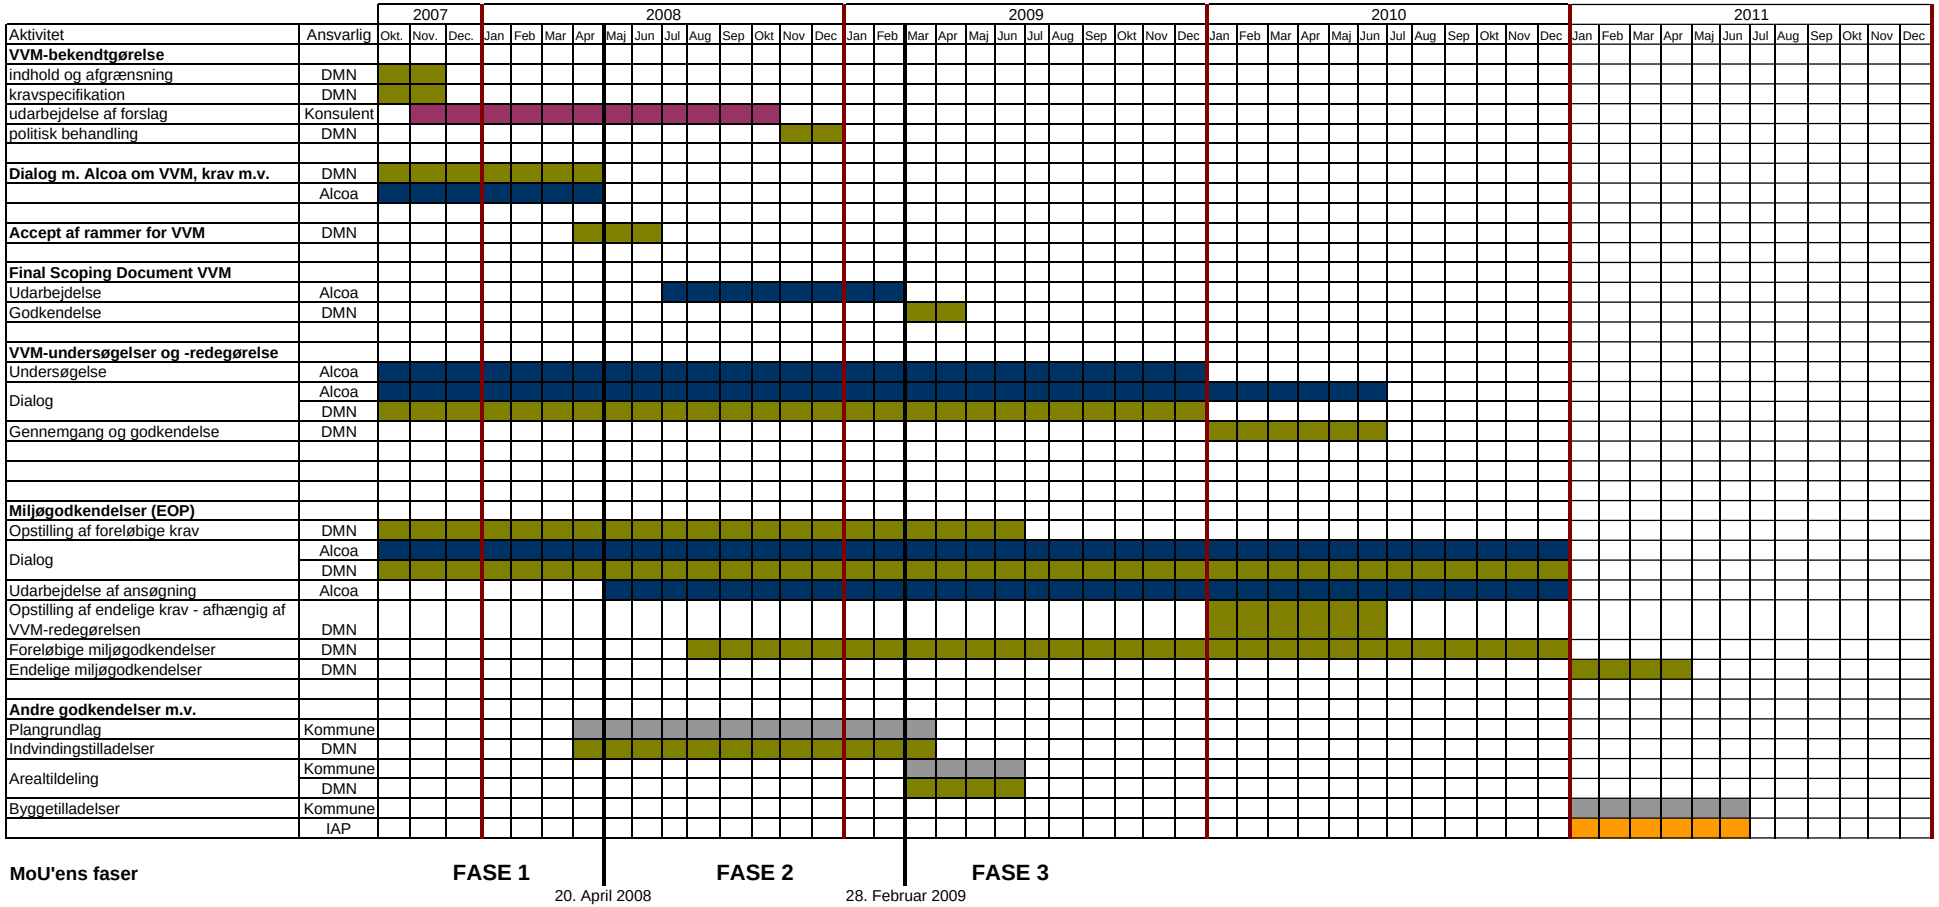
2007
2008
2009
2010
2011
Okt. Nov. Dec. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Aktivitet
Ansvarlig
VVM-bekendtgørelse
indhold og afgrænsning DMN
kravspecifikation DMN
udarbejdelse af forslag Konsulent
politisk behandling DMN
Dialog m. Alcoa om VVM, krav m.v. DMN
Alcoa
Accept af rammer for VVM DMN
Final Scoping Document VVM
Udarbejdelse Alcoa
Godkendelse DMN
VVM-undersøgelser og -redegørelse
Undersøgelse Alcoa
Dialog Alcoa
DMN
Gennemgang og godkendelse DMN
Miljøgodkendelser (EOP)
Opstilling af foreløbige krav DMN
Dialog Alcoa
DMN
Udarbejdelse af ansøgning Alcoa
Opstilling af endelige krav - afhængig af VVM-redegørelsen DMN
Foreløbige miljøgodkendelser DMN
Endelige miljøgodkendelser DMN
Andre godkendelser m.v.
Plangrundlag Kommune
Indvindingstilladelser DMN
Arealtildeling Kommune
DMN
Byggetilladelser Kommune
IAP
MoU'ens faser
FASE 1
FASE 2
FASE 3
20. April 2008
28. Februar 2009
